Приложение

Результаты мониторинга а/д
«Р-256 – Курочкино – Ларичиха»

Показатели		**км 0+000 - 2+000**	**км 4+400 - 9+900**	**км 12+700 - 31+347**
1. Протяженность, км		2,000	5,500	18,647
2. Интенсивность, авт/сут		-	-	805
3. Баллы дефектов		1,2	-	4,41
4. Ровность по IRI, %	в прямом направлении	-	92,73 (4)	100,00 (0)
	в обратном направлении	-	92,73 (4)	99,47 (1)
5. Прочность, МПа		-	-	4,57
6. Средняя плотность, кг/м^3		-	-	1,98
7. Водопоглощение, %		-	-	2,81
8. Модуль упругости, МПа		-	-	785

Результаты мониторинга а/д
«Бийск – Соколово – Акутиха»

Показатели		**км 54+030 - 61+830**
1. Протяженность, км		7,800
2. Интенсивность, авт/сут		264
3. Баллы дефектов		4,44
4. Ровность по IRI, %	в прямом направлении	98,72 (1)
	в обратном направлении	98,72 (1)
5. Прочность, МПа		2,92
6. Средняя плотность, кг/м^3		1,86
7. Водопоглощение, %		1,94
8. Модуль упругости, МПа		457,4

Результаты мониторинга а/д «Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – р. Обь»

Показатели		км 40+000 - 43+100	км 92+196 - 94+678	км 94+797 - 97+000
1. Протяженность, км		3,100	2,482	2,203
2. Интенсивность, авт/сут		140	-	-
3. Баллы дефектов		5,0	4,5	5,0
4. Ровность по IRI, %	в прямом направлении	96,77 (1)	100,00 (0)	81,82 (4)
	в обратном направлении	100,00 (0)	100,00 (0)	95,65 (1)
5. Прочность, МПа		4,17	2,88	5,66
6. Средняя плотность, кг/м^3		2,03	1,98	1,91
7. Водопоглощение, %		0,54	0,57	0,95
8. Модуль упругости, МПа		593,2	355,5	938,1
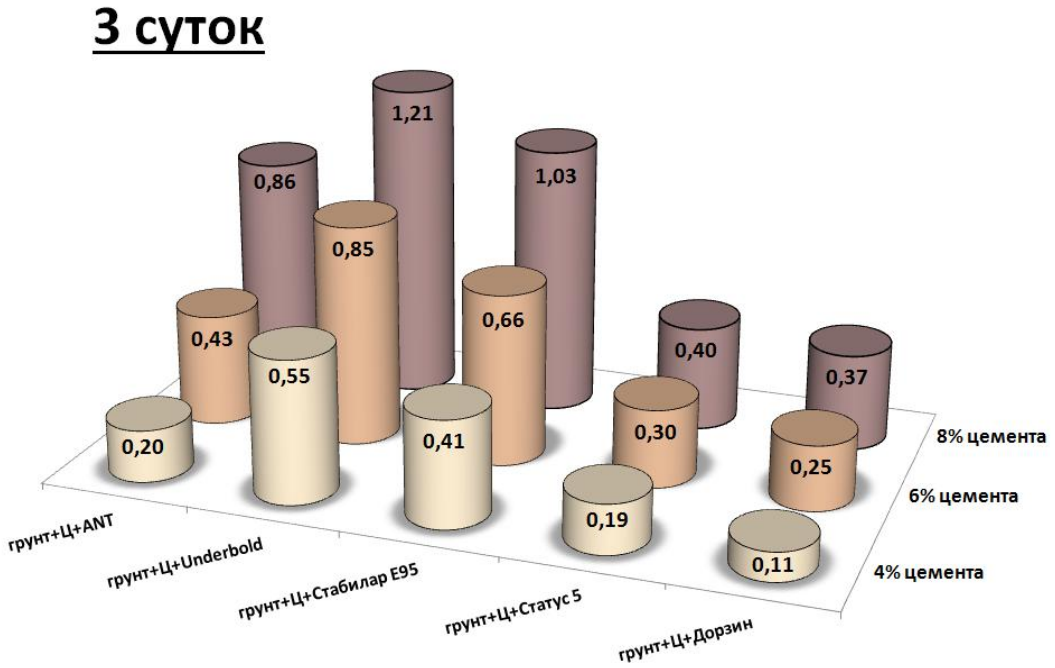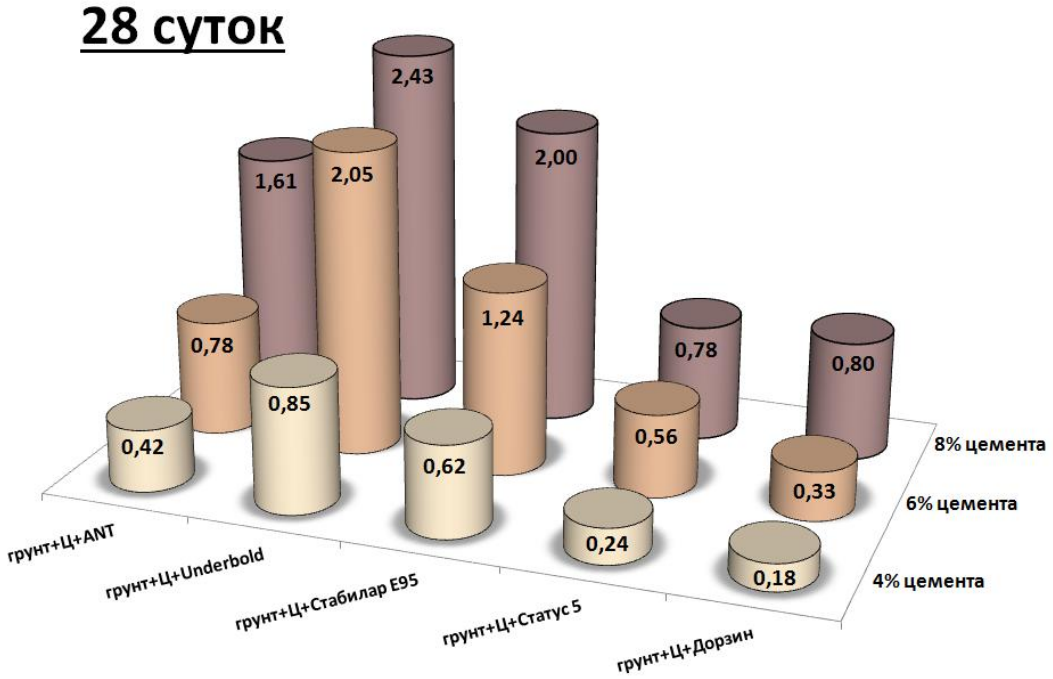
Результаты определения прочности (рекомендуемая нагрузка)
